



臺中市政府捷運工程局

G14站南側出入口及跨臺鐵連通道興建工程 施工標

招商說明會

2026/06/25



簡報大綱

1. 工程概要及工程背景
2. 特殊工作與風險項目
3. 施工動線
4. 完工示意圖
5. 施工標預定時程

工程概要

- 工程名稱：
G14站南側出入口及跨臺鐵連通道興建工程施工標
- 主辦機關：
臺中市政府捷運工程局
- 地點：臺中市九張犁站 (G14)
- 工程內容：
土建工程、水電及環境控制系統工程及電梯電扶梯工程
- 施工工期：
約 630 日曆天



工程背景


1. 本出入口因九德區段徵收用地延宕，原 CJ930 標未能施作。
2. 南出入口**主要之鋼構構件**已於 2017 年完成製作，現存放於**北屯機廠**。
3. 現階段由臺中捷運工程局接手續辦，主要施工項目包含：
 - 既有**鋼構構件檢測及整備**
 - 出入口**基礎開挖與基礎施作**
 - **鋼構組裝及跨越台鐵吊裝作業**等結構工程
 - **內外裝修、機電設備(含電梯及電扶梯)及景觀工程**
 - 各項**系統功能及整合測試(含動態系統整合測試)**
4. 本標旨在確保施工安全、品質及各界面協調順利完成。



捷運綠線G14站鋼構材照片


特殊工作與風險項目

1. 跨越台鐵吊裝作業：夜間非營運時段進行
2. 既有鋼構修復與再利用：除鏽、塗裝、假組立與組裝。
3. 環境安衛管理：
SHE[安全 (Safety)、健康 (Health)及環境保護(Environmental)]及防災措施。
4. 機電介面整合：協調與既有系統訊號、電力、通信介面。

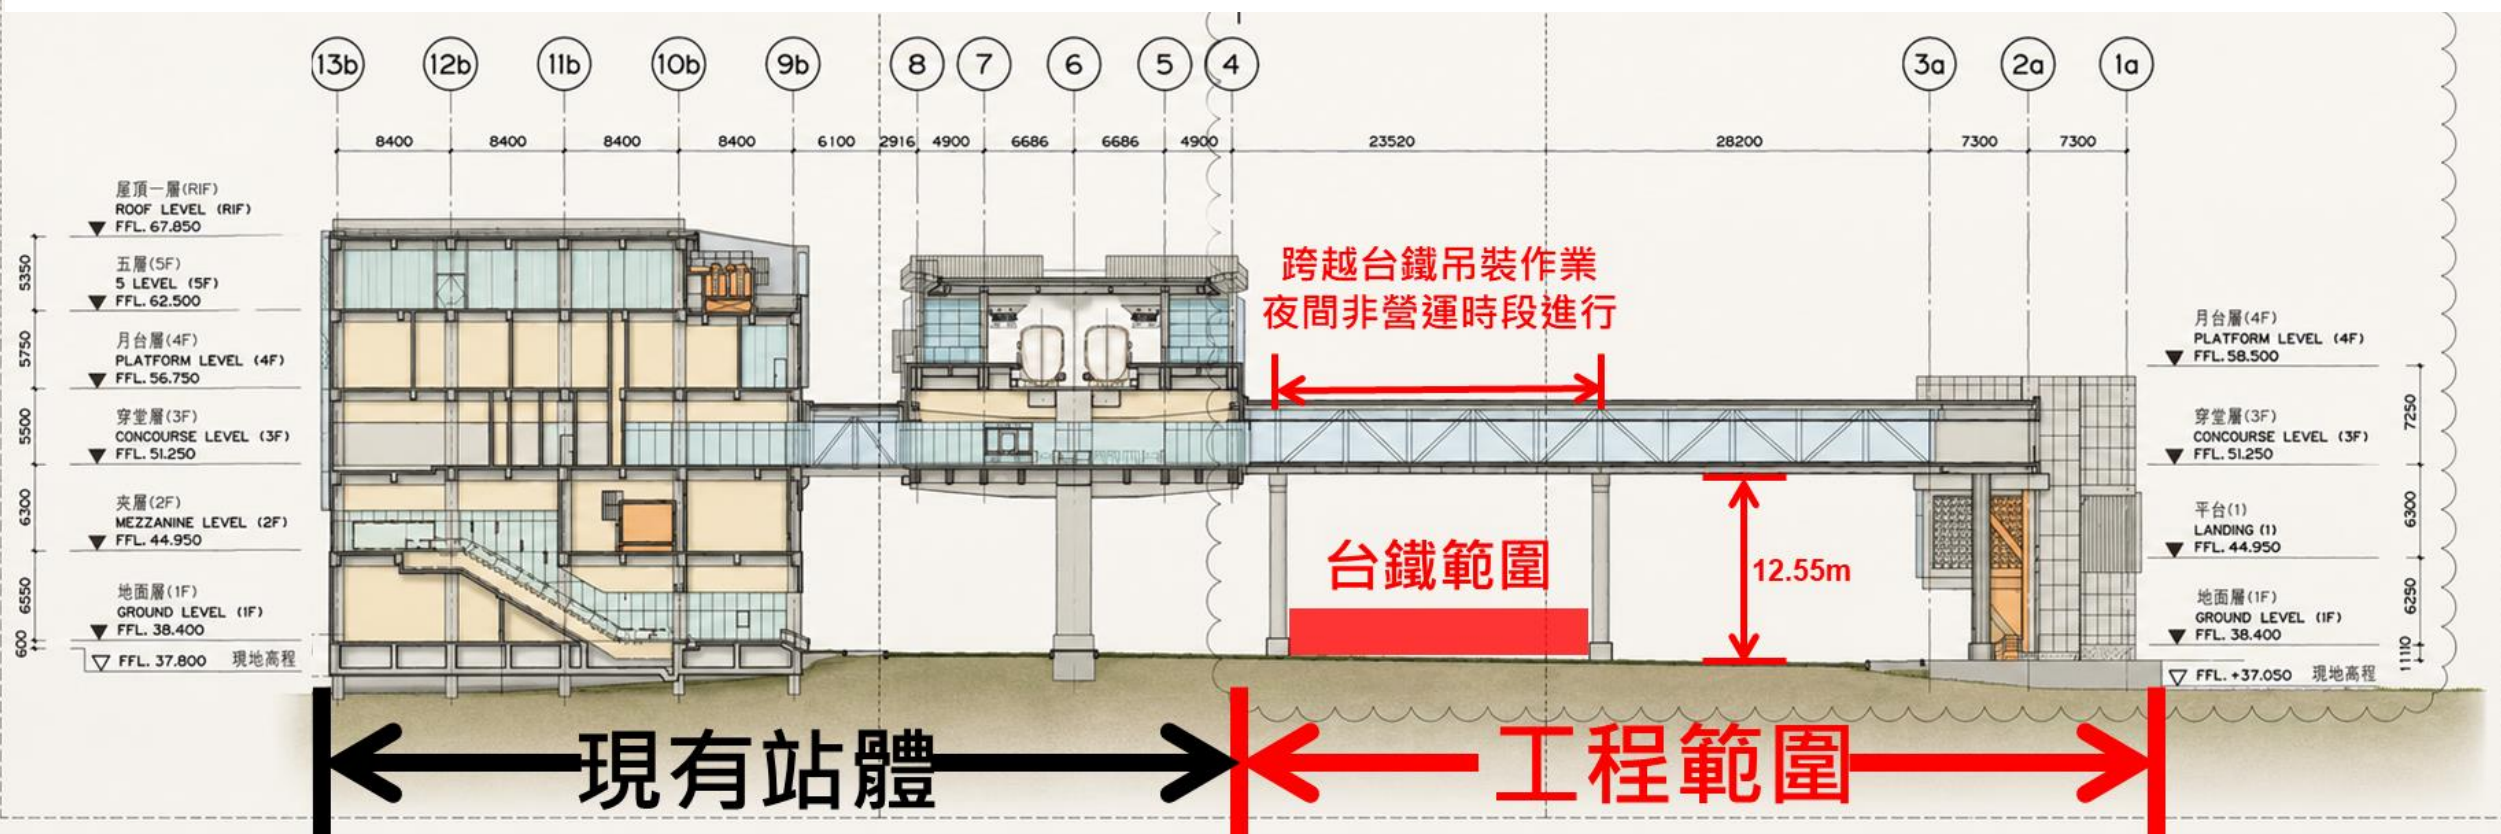

施工動線

本案鄰接「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」，周邊之計畫道路預計於9月完工點交

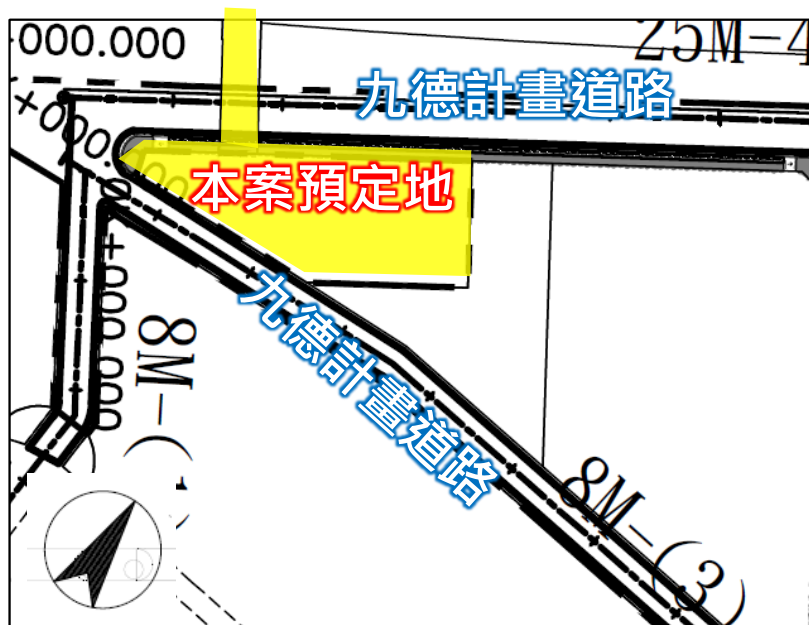

臺中市烏日九德地區區段徵收工程	
實際開工日期	113年11月21日
預計完工時間	117年03月31日
實際施工進度	115/5 : 28.738%
承包廠商	義力營造股份有限公司




完工示意圖

現況



完工模擬圖

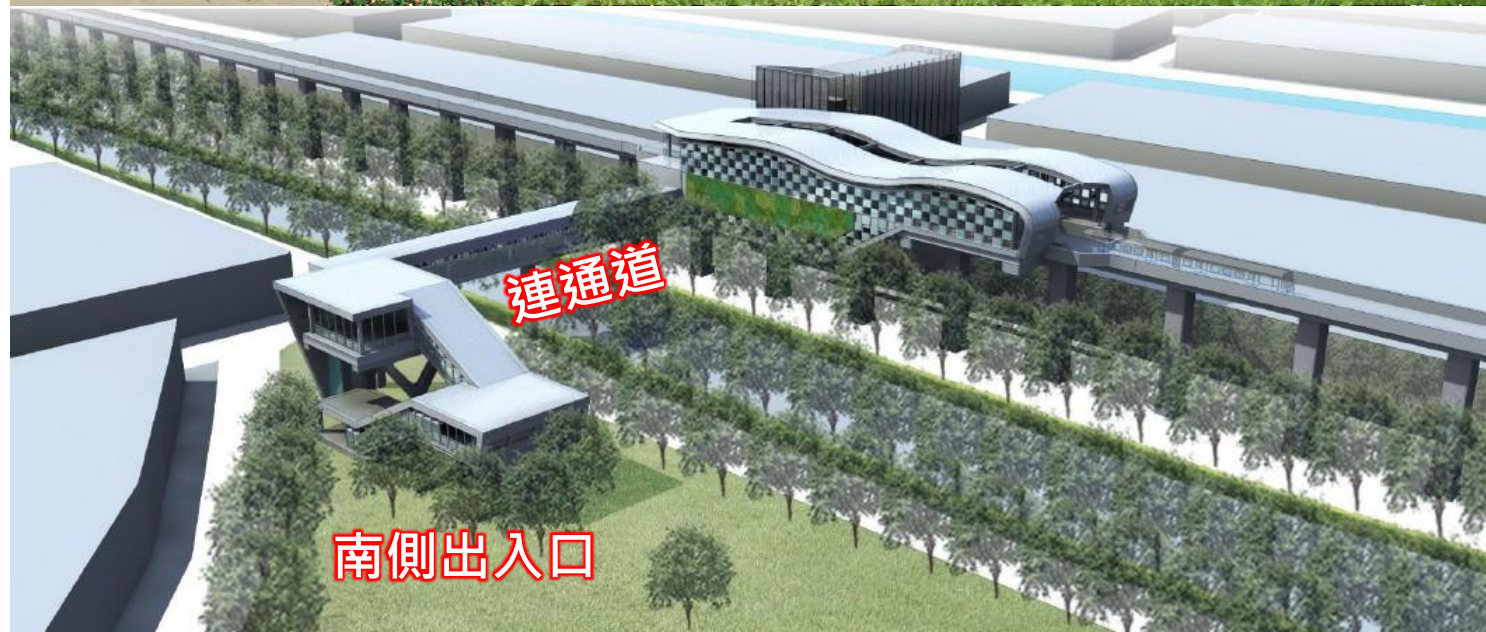

施工標預定時程

工作項目	2026 Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4	2028 Q1	Q2	Q3	Q4
招標作業											
發包與決標											
基地整備與鋼構檢測											
工程施工											
竣工驗收與保固											



報告結束
